

地方道路整備臨時交付金
目標達成型パッケージの
～事後評価～



宮城県遠田郡美里町建設課

電話：0229-33-2143

F A X：0229-33-2145

美里町におけるパッケージの設定

美里町では、国の補助事業である地方道路交付金事業（地方道路整備臨時交付金）を活用して小牛田駅周辺の環境整備を平成18年度から平成19年度の2年間で以下により実施してまいりました。

対象事業

小牛田駅周辺における歩行者の安全性を確保する道路整備

対象事業の期間


平成18年度～平成19年度（2年間）

対象事業の目的

小牛田駅、郵便局、警察署、銀行、高等養護学校等の公共公益施設への安全で円滑な交通を確保するための道路整備

対象事業の効果

小牛田駅周辺の町道を整備することにより、公共公益施設へのアクセスする道路の安全性と利便性を図ります。

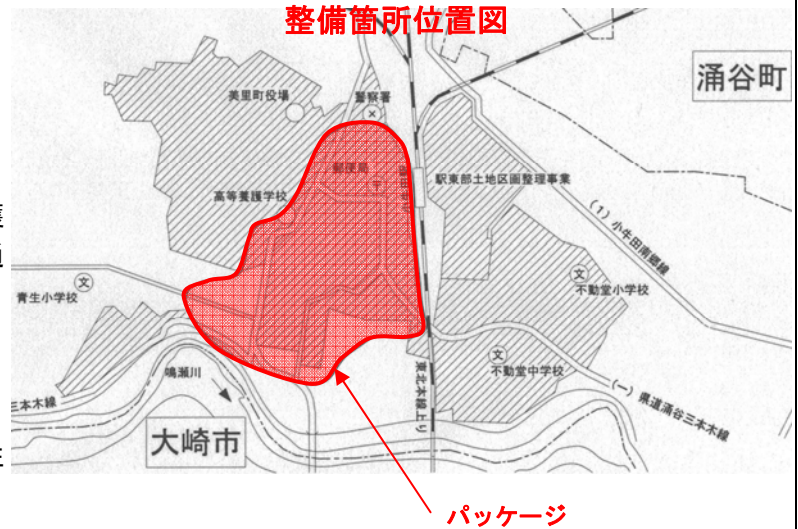

対象事業の成果目標（アウトカム指標）

通勤・通学者の安全歩行空間整備率

アウトカム指標の現況値及び目標値	当初現況値 0% (H18 当初)	⇒	長期目標値 100% (H19 末)
------------------	-------------------------	---	--------------------------

アウトカム指標の定義及び算定式

安全歩行空間の整備の促進

整備率 = (整備完了した延長 / 整備すべき延長 × 100)

パッケージの事後評価

進捗状況	整備完了した延長 整備すべき延長 $2,342.4\text{m} \div 6,382.1\text{m} \times 100 = 36.7\%$		
成果目標に対する事業の効果	進捗率では、36.7%となっているが、整備を行った箇所については、整備前には無かった歩行空間が確保され、車両と歩行者及び自転車のすれ違い時の通行の安全性が向上し、交通事故防止につながっています。		
成果目標の達成状況	目標値	100%	当初計画時点では、新町(H18.1 合併)の総合計画がまだ策定されていない状況であったが、事業実施にあたり、総合計画に基づき、実施計画の中で町全体の事業バランスを考慮し、本事業への財政負担可能額の調整を行ったため。
	実績値	36.7%	
今後の方針	未整備箇所については、引き続き事業を実施いたします。 また、平成20年度より新たなパッケージを設定し、危険箇所や要望のある箇所から優先的かつ効率的に整備を進めます。		

整備の事例

舗装補修（駅前梅ノ木線）

【整備前】

土水路で歩道が無い区間




ひび割れ、段差による振動

側溝を利用し歩道を設置

【整備後】

路上再生工法+舗装打ち換え

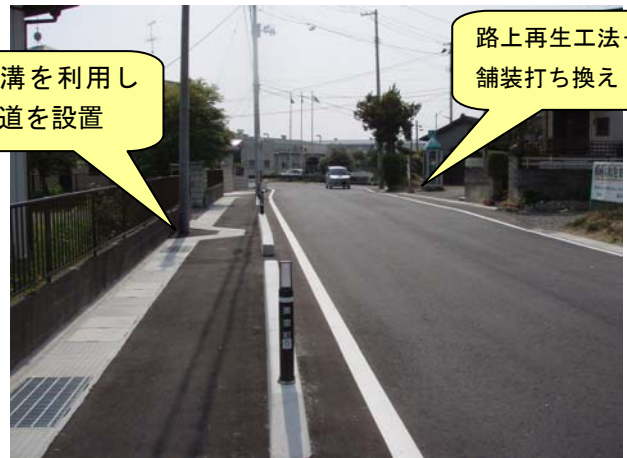

側溝整備（銀行裏通線）

【整備前】

側溝と舗装に段差がある



蓋掛側溝と区画線で歩行スペースを確保

【整備後】



側溝整備（桜木3号線）

【整備前】

側溝と舗装に段差がある



蓋掛側溝と区画線で歩行スペースを確保

【整備後】

